

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2024 dle
ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce č.p. 210 ve Vrchlabí“

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Vrchlabí**

Se sídlem: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

DIČ: CZ00278475

Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [redacted] odbor rozvoje města a územního plánování
mobil, telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka Vrchlabí
č.ú.: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **SILUS s.r.o.**

Společnost je zapsána: C 43947 vedená u krajského soudu v Hradci Králové

Se sídlem: Dolní Dvůr 138, 543 42 Dolní Dvůr

IČ: 08197784

DIČ: CZ08197784

Zastoupený: Romanem Slabým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: [redacted]
Telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: [redacted]

spolu uzavírají dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené Smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) s tím, že na druhou stranu nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění účelu díla jako nepotřebné (méněpráce).

III. Rozsah víceprací, méněprací a cena

1) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy v dále uvedeném rozsahu.

2) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je určena Změnovými listy č. 11 - 25, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.

3) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle čl. III, odstavce 2) tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle čl. III, odstavce 2) tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.

4) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnových listů č. 11 – 25 celkovou cenu víceprací a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem 337 701,62 Kč bez DPH

Méněpráce: cena celkem 219 685,19 Kč bez DPH

5) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací a méněprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	12 227 203,85 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č.1	433 289,51 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č.1	- 152 982,59 Kč bez DPH
Sjednaná cena díla dle Dodatku č.1	12 507 510,77 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č.2	337 701,62 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č.2	219 685,19 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena díla dle Dodatku č.2	12.625.527,20 Kč bez DPH

DPH 21%	2.651.360,71 Kč
---------	-----------------

Nově sjednaná cena díla celkem	15.276.887,91 Kč vč. DPH
---------------------------------------	---------------------------------

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek obsahuje změny veřejné zakázky de minimis dle § 222 odst.4 ZZVZ.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.


4) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 11 – 25

14. 01. 2026

Ve Vrchlabí dne

V dne

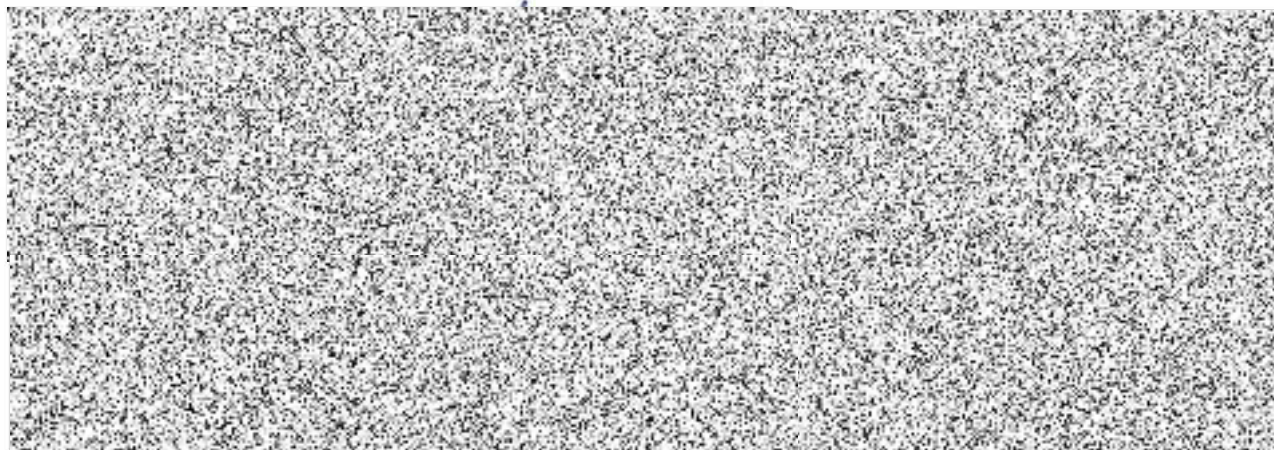

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOTACE
Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			118 016,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	118 016,43	24 783,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			142 799,88

Projektant



Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

DOTACE

Stavba:

Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.

Místo:

Datum:

1. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 016,43	142 799,88
ZL11	Omítky sklep	-4 750,19	-5 747,73
ZL12	Vytvoření sprchového koutu v úklidové místnosti	12 152,85	14 704,95
ZL13	Štítová stěna	11 583,11	14 015,56
ZL14	Odečtení listel	-14 827,58	-17 941,37
ZL15	VO Atrium	29 874,60	36 148,27
ZL16	Změna uchycení otopných těles a změna počtů	37 018,57	44 792,47
ZL17	Změna pantu ke dveřím č.9 (mezi roubenými místnostmi)	1 350,00	1 633,50
ZL18	Zábradlí vnitřní	8 082,94	9 780,36
ZL19	Příprava pro druhou elektro nabíječku kol	14 803,71	17 912,49
ZL20	Ventilátoru pro odvětrání radonu	10 440,40	12 632,88
ZL21	Interiér schod žula záměna za beton + dlažba místnost 1.04	-17 000,00	-20 570,00
ZL22	Šachty atrium	8 308,30	10 053,04
ZL23	Kamenné schodiště atrium	10 512,97	12 720,69
ZL24	Stěna v místnosti 1.02 za pultem	17 416,75	21 074,27
ZL25	Odpočet parapetů	-6 950,00	-8 409,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL11 - Omítky sklep

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-4 750,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 750,19	21,00%	-997,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-5 747,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL11 - Omítky sklep**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-4 750,19
HSV - Práce a dodávka HSV		-4 750,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-31 317,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		26 567,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL11 - Omítky sklep

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -4 750,19

D HSV Práce a dodávka HSV -4 750,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -31 317,81

1	K	611131151	Sanační postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	-8,778	154,21	-1 353,66
2	K	611325133	Omítka sanační jádrová vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	-8,778	594,89	-5 221,94
3	K	611325191	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	-8,778	133,83	-1 174,76
4	K	611328133	Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	-8,778	278,48	-2 444,50
5	K	6121311511	Trasvápenný postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-17,790	75,60	-1 344,92
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-17,790	191,75	-3 411,23
6	K	6123251311	Omítka trasvápenná jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-17,790	775,00	-13 787,25
7	K	6123251911	Příplatek k trasvápenné jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	-17,790	145,00	-2 579,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 567,62

9	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	26,568	628,00	16 684,70
10	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	26,567	372,00	9 882,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL12 - Vytvoření sprchového koutu v úklidové místnosti

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 152,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 152,85	21,00%	2 552,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			14 704,95
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL12 - Vytvoření sprchového koutu v úklidové místnosti**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		12 152,85
HSV - HSV		-22 556,20
725R - Odpočty		-22 556,20
PSV - Práce a dodávky PSV		34 709,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		33 216,50
781 - Dokončovací práce - obklady		1 492,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL12 - Vytvoření sprchového koutu v úklidové místnosti

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 152,85

D HSV HSV -22 556,20

D 725R Odpočty -22 556,20

1	K	725119008	Výlevka s ochrannou zadní stěnou, jež brání proniknutí vody. Vyrobená z polypropylenu odolného proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům.	kus	-1,000	7 560,00	-7 560,00
2	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	-1,000	1 239,38	-1 239,38
3	K	725532111	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 20 l / 2 kW	soubor	-1,000	13 756,82	-13 756,82

D PSV Práce a dodávky PSV 34 709,05

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 33 216,50

4	K	725241901	Montáž vaničky sprchové a sifonu	soubor	1,000	2 720,00	2 720,00
5	M	642R	vanička sprchová keramická obdélníková - Tracy, obdélníková, 405309, 100x80x3, litý mramor	kus	1,000	7 067,00	7 067,00
6	M	642R1	sifon 90	ks	1,000	602,00	602,00
7	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	1,000	2 320,00	2 320,00
8	M	554R	dveře sprchové skleněné - třídlílné posuvné dveře do niky 269904, RONSAS3 100 cm / aluchrom/čiré sklo	kus	1,000	11 114,00	11 114,00
9	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná a setu	kus	1,000	815,00	815,00
10	M	551R	baterie sprchová nástěnná - Vigour one, 478401, sprchová nástěnná	kus	1,000	2 199,00	2 199,00
11	M	551R1	příslušenství k baterii - set sprchový tyč 80	kus	1,000	1 044,00	1 044,00
12	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm - Dopojení TUV	m	9,000	489,00	4 401,00
13	K	HZS2232	Přemístění zásuvky ze sprchy na stěnu	hod	1,500	623,00	934,50

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 492,55

14	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,600	63,00	37,80
VV		3*0,2		0,600			
15	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,600	492,76	295,66
16	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,600	1 009,73	605,84
17	M	59761443	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	0,690	675,00	465,75
18	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035	2 500,00	87,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL13 - Štítová stěna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 583,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 583,11	21,00%	2 432,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			14 015,56
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL13 - Štítová stěna**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 583,11
HSV - Práce a dodávka HSV	-6 883,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 883,29
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 466,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL13 - Štítová stěna

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 583,11

D HSV Práce a dodávka HSV -6 883,29

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 883,29

1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-9,000	88,74	-798,66
2	K	622142012	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem	m2	-9,000	143,47	-1 291,23
3	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-9,000	271,01	-2 439,09
4	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-9,000	173,04	-1 557,36
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-9,000	88,55	-796,95

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 466,40

6	K	HZS2112	Rozebrání štítové stěny	hod	12,000	300,00	3 600,00
7	K	HZS2112.1	Očištění prken od hřebíků	hod	17,000	300,00	5 100,00
8	K	HZS2112.2	Montáž původních prken + nové laťování	hod	24,000	300,00	7 200,00
9	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,080	9 580,00	766,40
10	M	60514114.1	Spojovací materiál	kpl	1,000	300,00	300,00
11	K	HZS2112.3	Tmelení děr	hod	3,000	300,00	900,00
12	K	HZS2112.4	Olištování dveří	hod	2,000	300,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL14 - Odečtení listel

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-14 827,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-14 827,58	21,00%	-3 113,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-17 941,37
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL14 - Odečtení listel**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-14 827,58
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 827,58
781 - Dokončovací práce - obklady	-14 827,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL14 - Odečtení listel

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 827,58
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-14 827,58
D	781	Dokončovací práce - obklady					-14 827,58
1	K	781474251	Montáž obkladů vnitřních keramických listel v do 65 mm lepených flexibilním lepidlem	m	-23,060	500,00	-11 530,00
2	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	-25,366	130,00	-3 297,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL15 - VO Atrium

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 874,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 874,60	21,00%	6 273,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			36 148,27
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL15 - VO Atrium

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 874,60
M - Práce a dodávky M	29 874,60
216-M - Elektromontáže	29 874,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL15 - VO Atrium

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 29 874,60

D M Práce a dodávky M 29 874,60

D 216-M Elektromontáže 29 874,60

1	M	48001	Sadové svítidlo - zdroj LED, 26 W, 2700 °K, IP66, tělo: hliníkový odlitek, optika: PMMA, ochranný kryt: polykarbonát	ks	-2,000	5 929,30	-11 858,60
2	M	48001R	Classic Street - BDP794 10/727 DN09 MK-RAL6005	ks	2,000	18 074,10	36 148,20
3	M	48011	Sadový ocelový třístupňový stožár 5,8 m, s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, RAL 9007 - typ dle správce VO	ks	-2,000	8 729,70	-17 459,40
4	M	48011R	stožár kuželový + stožárová svorkovnice3m nad zemí, 0,6m vetknutí, 2x kab.otvor 90/270st.vs dvířkatop 60mm1x dvířka barva Gris 900 Sablé	ks	2,000	12 589,50	25 179,00
5	M	48121	Stožárová svorkovnice SR, 1 pojistka	ks	-2,000	1 067,30	-2 134,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL16 - Změna uchycení otopných těles a změna počtů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 018,57
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 018,57	21,00%	7 773,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			44 792,47
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL16 - Změna uchycení otopných těles a změna počtů**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 018,57
PSV - Práce a dodávky PSV	37 018,57
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	37 018,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL16 - Změna uchycení otopných těles a změna počtů

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 37 018,57

D PSV Práce a dodávky PSV 37 018,57

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 37 018,57

1	K	735152277	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W	kus	-5,000	3 926,73	-19 633,65
2	K	735152376	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 880 W	kus	1,000	4 460,00	4 460,00
3	K	735152377	Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přidavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W	kus	9,000	4 690,00	42 210,00
4	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	1,000	5 529,25	5 529,25
5	K	735152676	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	-1,000	6 869,00	-6 869,00
6	K	735152679	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W	kus	-1,000	7 898,03	-7 898,03
7	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,150	5 000,00	750,00
8	M	M1.0	COSMO sada 2 ks stojánkových konzol pro desková otopná tělesa (2ks konzole, 4ks krytka bílá, uchycení)	ks	10,000	1 847,00	18 470,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL17 - Změna pantu ke dveřím č.9 (mezi roubenými místnostmi)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 350,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 350,00	21,00%	283,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 633,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL17 - Změna pantu ke dveřím č.9 (mezi roubenými místnostmi)

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 350,00
766 - Konstrukce truhlářské		1 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL17 - Změna pantu ke dveřím č.9 (mezi roubenými místnostmi)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 350,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 350,00

D 766 Konstrukce truhlářské

1 350,00

1	K	766.1	Pant dle SoD mosaz	ks	-3,000	200,00	-600,00
2	K	766.2	Pant dle výběru investora černá	ks	3,000	650,00	1 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL18 - Zábradlí vnitřní

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 082,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 082,94	21,00%	1 697,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 780,36
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL18 - Zábradlí vnitřní**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 082,94
PSV - Práce a dodávky PSV		8 082,94
767 - Konstrukce zámečnické		8 082,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL18 - Zábradlí vnitřní

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 082,94

D PSV Práce a dodávky PSV 8 082,94

D 767 Konstrukce zámečnické 8 082,94

1	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	-6,300	750,00	-4 725,00
2	M	5539990051	zábradlí ocelové kované včetně nátěru - Z1	m	-6,300	2 500,00	-15 750,00
3	K	767R	D+M doplnění stávajícího zábradlí + výrova jednoho sloupku	kpl	1,000	14 894,50	14 894,50
4	K	767R1	D+M nerezová černá síť	bm	6,300	2 168,80	13 663,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL19 - Příprava pro druhou elektro nabíječku kol

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 803,71
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 803,71	21,00%	3 108,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 912,49
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL19 - Příprava pro druhou elektro nabíječku kol**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		14 803,71
HSV - Práce a dodávka HSV		4 347,49
1 - Zemní práce		4 347,49
M - Práce a dodávky M		9 342,22
213-M - Elektromontáže		6 363,42
216-M - Elektromontáže		2 978,80
PSV - Práce a dodávky PSV		1 114,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		1 114,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL19 - Příprava pro druhou elektro nabíječku kol

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 803,71

D HSV Práce a dodávka HSV 4 347,49

D 1 Zemní práce 4 347,49

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	985,14	3 447,99
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,500	257,00	899,50

D M Práce a dodávky M 9 342,22

D 213-M Elektromontáže 6 363,42

3	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	ks	20,000	41,98	839,60
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	24,30	486,00
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	3,000	26,92	80,76
6	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	20,000	231,46	4 629,20
7	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	2,000	163,93	327,86

D 216-M Elektromontáže 2 978,80

8	M	00201.1	Trubka ohebná instal. 25 mm	m	20,000	7,30	146,00
9	M	01405	Drát AlMgSi-0,5 d=8mm	m	20,000	110,29	2 205,80
10	M	01424	Svorka zkušební SZ - nerez	ks	2,000	46,80	93,60
11	M	02918	CYKY-J 3x2.5mm2	m	20,000	26,67	533,40

D PSV Práce a dodávky PSV 1 114,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 114,00

12	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	244,00	244,00
13	M	35829011	chránič proudový 2 pólový 16A typ B	kus	1,000	870,00	870,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL20 - Ventilátoru pro odvětrání radonu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 440,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 440,40	21,00%	2 192,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 632,88
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL20 - Ventilátoru pro odvětrání radonu**
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 440,40
HSV - Práce a dodávky HSV	4 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 300,00
M - Práce a dodávky M	3 791,40
213-M - Elektromontáže	1 402,20
216-M - Elektromontáže	2 389,20
PSV - Práce a dodávky PSV	2 349,00
751 - Vzduchotechnika	2 349,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL20 - Ventilátoru pro odvětrání radonu

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 440,40

D		HSV	Práce a dodávky HSV					4 300,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 300,00
1	K	971028471	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750 mm	kus	1,000	1 720,00		1 720,00
2	K	310237271	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 600 do 750 mm + štuk + výmalba	kus	1,000	2 580,00		2 580,00
D		M	Práce a dodávky M					3 791,40
D		213-M	Elektromontáže					1 402,20
3	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	20,000	25,50		510,00
4	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	10,000	26,92		269,20
5	K	HZS	Montáž spínacích hodin	hod	1,000	623,00		623,00
D		216-M	Elektromontáže					2 389,20
6	M	02960	CYKY-J 5x1.5mm2	m	20,000	24,96		499,20
7	M	35889830	týdenní spínací hodiny pro ventilátor se zálohou	kus	1,000	1 890,00		1 890,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 349,00
D		751	Vzduchotechnika					2 349,00
8	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	249,00		249,00
9	M	429R	ventilátor axiální stěnový z plastu IP44 bílý	kus	1,000	2 100,00		2 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL21 - Interiér schod žula záměna za beton + dlažba místnost 1.04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-17 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-17 000,00	21,00%	-3 570,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-20 570,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL21 - Interiér schod žula záměna za beton + dlažba místnost 1.04

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-17 000,00
HSV - Práce a dodávka HSV	-17 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	-17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:

ZL21 - Interiér schod žula záměna za beton + dlažba místnost 1.04

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -17 000,00

D HSV Práce a dodávka HSV -17 000,00
D 4 Vodorovné konstrukce -17 000,00

1	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných na desku	m	-2,400	1 500,00	-3 600,00
2	M	583880101	stupeň schodišťový žulový plný 140x300 mm rovný - vyrobený ze stávajícího ostění	m	-2,400	8 500,00	-20 400,00
3	K	R1.0	Bednění, betonáž, obklad, spárování	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
4	M	M1.0	Prkna, beton, dlažba, spárovací hmota	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL22 - Šachty atrium

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 308,30
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 308,30	21,00%	1 744,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 053,04
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL22 - Šachty atrium

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 308,30
HSV - Práce a dodávky HSV	8 308,30
8 - Trubní vedení	8 308,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL22 - Šachty atrium

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 308,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 308,30
D	8		Trubní vedení				8 308,30
1	K	894.1	D+M šachta u sezení vinárny - plastová skruž + poklop	kus	1,000	4 545,80	4 545,80
2	K	894.2	D+M nový poklop uprostřed atria	kus	1,000	3 762,50	3 762,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL23 - Kamenné schodiště atrium

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 512,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 512,97	21,00%	2 207,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 720,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.

Objekt: **ZL23 - Kamenné schodiště atrium**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 1. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		10 512,97
HSV - Práce a dodávky HSV		-4 223,07
4 - Vodorovné konstrukce		-4 223,07
PSV - Práce a dodávky PSV		14 736,04
772 - Podlahy z kamene		14 736,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL23 - Kamenné schodiště atrium

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 512,97

D HSV Práce a dodávky HSV -4 223,07

D 4 Vodorovné konstrukce -4 223,07

1	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	-6,000	353,89	-2 123,34
2	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-3,000	587,84	-1 763,52
3	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-3,000	112,07	-336,21

D PSV Práce a dodávky PSV 14 736,04

D 772 Podlahy z kamene 14 736,04

4	K	772231303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	-6,000	697,53	-4 185,18
5	M	58387623	nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 50mm	m	-6,300	1 710,00	-10 773,00
6	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	-6,000	469,18	-2 815,08
7	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm	m	-6,300	464,00	-2 923,20
8	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	-0,521	2 500,00	-1 302,50
9	K	R1.0	Schody venkovní (řezání, formátování, jehlování, sekání hran, osazení, spárování)	kpl	1,000	36 735,00	36 735,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL24 - Stěna v místnosti 1.02 za pultem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			17 416,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 416,75	21,00%	3 657,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			21 074,27
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.

Objekt: ZL24 - Stěna v místnosti 1.02 za pultem

Místo: Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		17 416,75
HSV - Práce a dodávky HSV		17 416,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		17 416,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL24 - Stěna v místnosti 1.02 za pultem

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 416,75
D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 416,75
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				17 416,75
1	K	342241161	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 65 mm	m2	7,250	803,00	5 821,75
VV		2,5*2,9			7,250		
2	K	342R	Vytvoření a oštukování fabionu v historickém vzhledu	bm	3,000	3 865,00	11 595,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt:
ZL25 - Odpočet parapetů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-6 950,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 950,00	21,00%	-1 459,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-8 409,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: **ZL25 - Odpočet parapetů**

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-6 950,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-6 950,00
766 - Konstrukce truhlářské	-6 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce c.p.210 - SILUS s.r.o.
Objekt: ZL25 - Odpočet parapetů

Místo: Datum: 1. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 950,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-6 950,00
D	766	Konstrukce truhlářské					-6 950,00
1	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	-4,000	500,00	-2 000,00
2	M	607941001	parapet dřevěný vnitřní š 150mm "par 1"	m	-3,300	1 500,00	-4 950,00
